

PROYECTO DE DESARROLLO AGRARIO SOCIALISTA DEL MUNICIPIO GUANARITO, ESTADO PORTUGUESA

Fichas Descriptivas y de Avance 2010

Febrero, 2011

FICHA RESUMEN

Nombre Proyecto: Proyecto de Desarrollo Agrario Socialista del Municipio Guanarito, estado Portuguesa.

Descripción: Proyecto que apunta al fomento el desarrollo integral del polígono del Municipio Arismendi con el Municipio Guanarito, a través de la construcción de obras de infraestructura de apoyo a la producción y obras sociales, además de la ejecución de actividades productivas, con el impulso a las organizaciones existentes en el eje, a través de las diferentes acciones propuestas en el proyecto a objeto de contribuir con el mejoramiento la calidad de vida de las familias que se encuentran establecidas allí.

Fuente de Financiamiento: Convenio entre Banco de Desarrollo de China y BANDES

Tipo de Financiamiento:

No retornable: 7.769.230,17 \$ // 573.888.826,09 ¥

FICHA DESCRIPTIVA

Nombre Proyecto: Proyecto de Desarrollo Agrario Socialista del Municipio Guanarito, estado Portuguesa.

Ubicación Geográfica:

Partiendo de la ciudad de Guanare se recorren aproximadamente 70 Km. Hasta el poblado de Guanarito donde comienza el Eje Guanarito – Arismendi, partiendo del centro poblado Guanarito vía la Capilla se recorren 120 km hasta llegar al centro poblado de Arismendi, de donde se parte con rumbo sur oeste hacia la UPP Batalla de Santa Inés.

Metas:

1. Fortalecimiento de la Unidad de Propiedad Patria Batalla de Santa Inés (antiguo Hato Agro bárbara).
2. Construcción y rehabilitación de 120 km de vialidad asfaltada en el eje Guanarito Arismendi.
3. Construcción y acondicionamiento de 40 km de vialidad secundaria eje Arismendi-UPP Batalla de Santa Inés.
Construcción de puente de 78 m2 sobre caño Guanare Viejo.
4. Construcción de puente de 120 m2 sobre Caño del Medio.
5. Construcción y equipamiento de tres (3) receptorías de leche.
6. Construcción de 220 unidades de viviendas.
7. Construcción de dos (2) módulos de asistencia social (Simoncitos, Modulo Barrio Adentro Tipo I, Canchas deportivas, Mercal tipo I).

Objetivos:

Fomentar el desarrollo integral del polígono del Municipio Arismendi con el Municipio Guanarito, a través de la construcción de obras de infraestructura de apoyo a la producción y obras sociales, además de la ejecución de actividades productivas, con el impulso a las organizaciones existentes en el eje, a través de las diferentes acciones propuestas en el proyecto a objeto de contribuir con el mejoramiento la calidad de vida de las familias que se encuentran establecidas allí.

FICHA DESCRIPTIVA

Objetivos:

Fomentar el desarrollo integral del polígono del Municipio Arismendi con el Municipio Guanarito, a través de la construcción de obras de infraestructura de apoyo a la producción y obras sociales, además de la ejecución de actividades productivas, con el impulso a las organizaciones existentes en el eje, a través de las diferentes acciones propuestas en el proyecto a objeto de contribuir con el mejoramiento la calidad de vida de las familias que se encuentran establecidas allí.

Acciones:

Fortalecer la actividad agroproductiva en la zona. Impulsar el fortalecimiento del nuevo modelo productivo socialista, con el fin de cubrir los requerimientos nutricionales y el bienestar social. Contribuir con el fortalecimiento de la soberanía alimentaría del pueblo venezolano. Construcción y equipamiento de obras de infraestructura de apoyo a la producción.

Impactos:

1. Se beneficiara una población aproximada de 23.400 habitantes de ellos, 9.300 niños.
2. Se generarán de 7.832 empleos totales.
3. Se generarán 1.958 empleos directos.
4. Se generaran 5.874 empleos indirectos

Problemas

No se ha concretado la entrega del anticipo contractual.
Falta 88 % de la ingeniería de detalle de la vialidad principal.

FICHA DE AVANCE

Acciones Actuales:

- Acompañamiento permanente por parte del MAT central e INDER, para concluir la ingeniería de detalle. La empresa CEIEC se comprometió a realizar una entrega parcial el día 15/03/2011
- Designación del Ing. Luís Sánchez (Gerencia de Hidroagrícola INDER) para el seguimiento de la ejecución.
- Se coordinó para el día martes 15/03/2011, una reunión en campo con el objetivo de adelantar la ejecución y empoderamiento por parte de la Gerencia de Hidroagrícola INDER

Evaluación Financiera:

Monto Aprobado: 7.769.230,17 us\$; 573.888.826,09 Remimbis

Monto ejecutado: 0

% de ejecución financiera: 0

Producción general:

Se estima incrementar la producción a 2.900.000 l/año de leche líquida.



Se estima aumentar el procesamiento de leche en 100.000 l/día

Ejecución:

Se realizó el alineamiento y replanteo de los primeros 15 km de vialidad principal, partiendo desde Guanarito.

MEMORIA FOTOGRÁFICA

Obra prioritaria

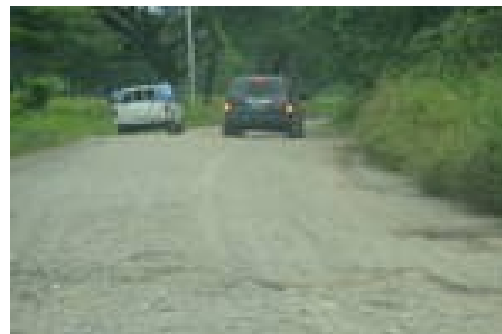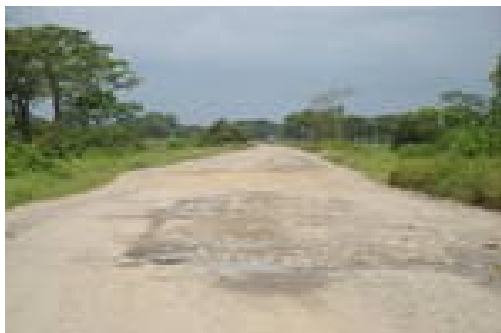

Vistas de algunos tramos de la vialidad Guanarito-Arismendi, en los tramos críticos no existe la carpeta de rodamiento e incluso la base tampoco existe

Acta inicio de Obra prioritaria



MEMORIA FOTOGRÁFICA



Llegada de maquinarias y equipo para dar inicio a
vialidad en Guanarito
