

PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO AGRARIO SOCIALISTA RÍO TIZNADOS, ESTADO GUÁRICO. II ETAPA

Fichas Descriptivas y de Avance 2010

Febrero, 2011

FICHA RESUMEN

Nombre Proyecto: Proyecto Agrícola Integral Socialista Río Tiznados

Descripción:

Construcción del un sistema de riego para la producción agrícola en 20.000 Ha donde se conforma y desarrolla una unidad de producción primaria como herramienta de cambio orientada hacia el modelo productivo socialista mediante el diseño, construcción e instalación de canales y equipos de riego e impulsando el desarrollo de diversos rubros así como el acompañamiento técnico integral y formación a los campesinos agrupados en un Repla.

Fuente de Financiamiento 2.010: Fondo Chino

Monto de Financiamiento 2.010:

Retornable y no retornable
249.750.000 \$

Monto de Financiamiento 2.011:

FICHA DESCRIPTIVA

Nombre Proyecto: Proyecto Integral de Desarrollo Agrario Socialista Río Tiznados, Estado Guárico.

Ubicación Geográfica: Municipio Ortiz, Parroquia San Francisco de Tiznado, edo. Guárico.

Metas:

1. Incorporar 8.210 nuevas hectáreas para el cultivo de cereales, leguminosas y hortalizas
2. Infraestructura de apoyo a la producción:
3. Construcción de 4 Km. De Canal Primario con tomas prediales, Construcción 18,68 Km. de Canales Secundarios con tomas prediales, Construcción 30 Km. de Canales terciarios con tomas prediales. Establecimiento de 7.000 ha de riego por aspersión y Establecimiento de 610 ha de riego por goteo. Construcción de 10 Km. de Canales de drenaje.
4. Infraestructura Social: Construcción de 203 viviendas

Objetivos: Conformar y desarrollar una unidad de producción primaria como herramienta de cambio orientada hacia el modelo productivo socialista mediante el diseño, construcción e instalación de canales y equipos de riego e impulsando el desarrollo de diversos rubros así como el acompañamiento técnico integral al productor.

Impactos:

1. Construcción y rehabilitación de obras de infraestructuras de riego, para la incorporación y ampliación de áreas regables.
2. Diseño y construcción de nuevos enfoques de urbanismo rural socialista basado en el concepto de ciudades comunales donde la comunidad cuente con todos servicios.
3. Establecimiento de infraestructura productiva, donde se desarrolle toda la cadena o circuito productivo (producción, almacenaje, transformación, transporte y colocación) a través de plantas, equipos y materiales.
4. Apoyo financiero y tecnológico para desarrollo de una agricultura sustentable y comprometida con la seguridad alimentaria del país.
5. Apoyo técnico y organizacional para el desarrollo de un nuevo modelo de gestión socio-productiva que este basado en nuevos valores y de relación de producción socialista
6. Articulación del trabajo socio institucional, para la creación de redes sociales de trabajo comunal, producción, alimentación y otros.
7. 47 productores beneficiados pertenecientes a la red de productores libres y asociados (RPLA) y la unidad socialista con 3600 ha

FICHA DESCRIPTIVA

Problemas:

1. Para el año 2011 se requieren de 13.000 ha. Se disponen 6.067 ha rescatadas, por lo tanto se requiere rescatar 7.000 ha. En San José de Tizado actualmente está en proceso de rescate 5.529 ha.
2. Se hace necesario un trabajo de acompañamiento permanente y formación política ideológica a los campesinos miembros de la REPLA.
3. El cambio de empresa transnacional ejecutora de las obras de infraestructura del proyecto ha causado retrasos en los avances del mismo.
4. Es necesario ejecutar las obras de riego parcelario, donde ya existen canales de riego principales para tecnificar los procesos de siembra bajo riego.

FICHA DE AVANCE

Acciones Actuales:

1. Se identificaron las áreas de inicio de obras, tales como, continuación de canales secundarios y terciarios con tomas prediales. Revisión de ingeniería de detalle de las obras presentes y reingeniería del sistema de riego.
2. Se realizó el plan de siembra 2.011 y actualmente se está realizando la preparación de tierras para el próximo ciclo de invierno.

Evaluación Financiera:

Monto Aprobado: 249.750.000,00 \$

Monto ejecutado: 104.453.709,08 \$

Producción General:

35.000 tn./año de alimento

115.448,00 toneladas de cereales.


Ejecución:

Adelantado 80 % de la ingeniería de detalle, se estima inicio de obra para el 06 de marzo de 2011, en las tomas prediales.

Se inicio la puesta en marcha de la planta de procesamiento de frutas y hortalizas.

Los silos para la recepción de maíz se encuentran operativos con 4.000 ton almacenadas.

MAPA DE UBICACIÓN

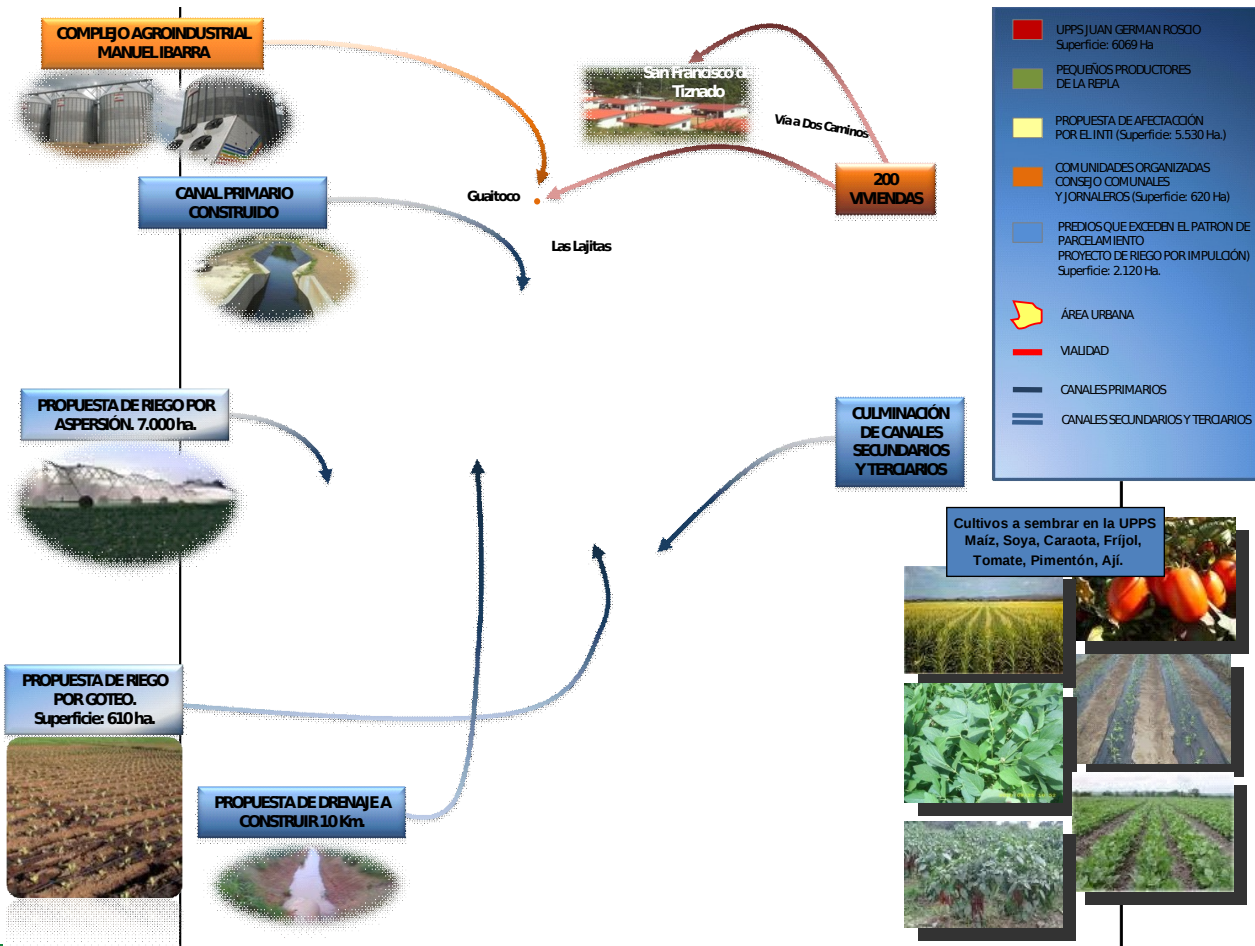



Continuación de canales secundarios



Continuación de canales secundarios



Continuación de canales terciarios



Construcción de drenaje en el sistema
